



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal

End: Praça Gentil veras, nº 380, Centro, Araguacema – TO.

Prop: Prefeitura Municipal de Araguacema



Foto 01 – Fachada da prefeitura.

Fachada será conservada, remover pintura velha e executar nova pintura.

Cobertura – Retirar toda telha cerâmica tipo plan e estrutura de madeira. Colocar estrutura metálica de cobertura com nova telha cerâmica plan.



Foto 02 – Fachada Lateral.



Foto 03 – Piso interno hall superior.

Este piso de cerâmica será removido e substituído por cerâmica porcelanato.



Foto 04 – Piso interno hall superior.



Foto 05 – Copa.



Foto 06 – DML.



Foto 07 e 08 – Revestimento das paredes da copa e área de serviço soltando
Remover todo revestimento das paredes da copa e área de serviço (Depósito de Materiais
de Limpeza. Assentar nova cerâmica de parede em toda cozinha e área de serviços.

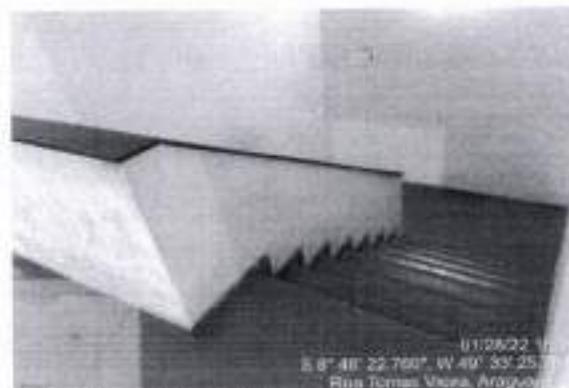
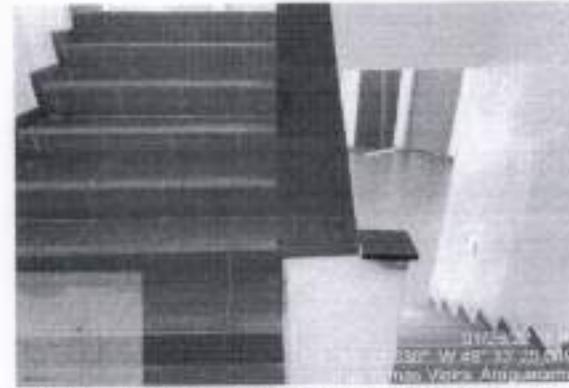


Foto 09 e 10 – Degraus (espelho e piso) da escada foram das dimensões fora das normas e
cerâmica inadequada para escada.
Retirar toda cerâmica do espelho e piso para executar piso e espelho com dimensões dentro
das normas e cerâmica ante derrapante.



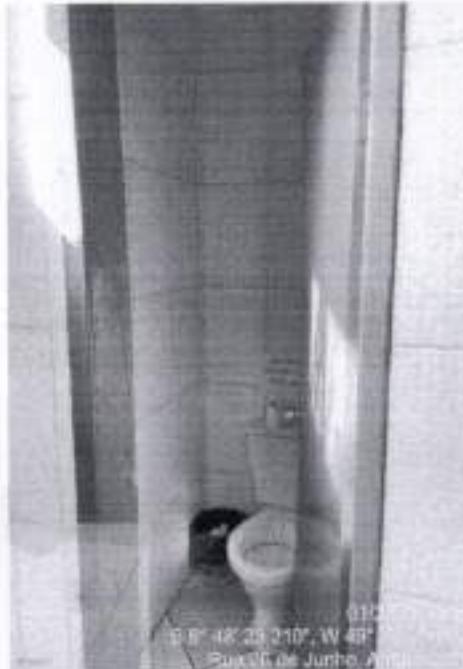


Foto 11 e 12. Box's dos banheiros em ambos os sexos.

Remover todo revestimento das paredes dos banheiros. Assentar nova cerâmica de parede em todas paredes. Demolir as paredes dos box's até altura de 1,80 m, para melhorar a iluminação e ventilação dos banheiros.



Foto 13 – Revestimento do teto da escada e fundo do reservatório.

Reservatório deverá realizar uma impermeabilização dentro das normas, para voltar a funcionar corretamente.

Remover revestimento do banheiro do gabinete e colocar nova cerâmica de parede.



Foto 14. Revestimento das paredes do banheiro do gabinete do prefeito.



Foto 15 – Floreira marquise frente do prédio.

Floreira deixou de ser usada devido a impermeabilização não resistir mais. Executar uma nova impermeabilização com manta apropriada.



Foto 16 – Floreira marquise do prédio.

Floreira deixou de ser usada devido a impermeabilização não resistir mais. Executar uma nova impermeabilização com manta apropriada.



Foto 17 – Esquadrias metálica com vidro.

Todas janelas deverá ser retiradas e colocadas esquadrias de vidro temperados de 8,0mm. No pavimento térreo também ser retirada da cerâmica de piso e colocado cerâmica porcelanato.



Foto 18 – Hall do pavimento térreo.

Todas janelas deverá ser retiradas e colocadas esquadrias de vidro temperados de 8,0mm. No pavimento térreo também ser retirada da cerâmica de piso e colocado cerâmica porcelanato.



Foto 19 – Calçada para ser demolida e refazer.



Foto 20 - Calçada para ser demolida e refazer.



Foto 21 – Forro do beiral.

Retirar todo forro de madeira no beiral da cobertura e executar outro forro de ferro acartonado que pode molhar.
Na entrada principal deverá ser executado uma rampa para PNE.



Foto 22 – Fachada principal.



Foto 23 – Louça e revestimento dos banheiros. Foto 24 – Instalações hidro-sanitárias.
Todos as louças deverão ser trocadas. Vaso será com caixa acoplada.






01/06/2012 12:30
S: 8° 48' 22.607" W: 49° 39' 26.524"
Rua 26 de Junho, Araguacema



01/06/2012 12:31
S: 8° 48' 22.600" W: 49° 39' 26.520"
Rua 26 de Junho, Araguacema

Foto 25 – Fundo do prédio da prefeitura.
Remover as esquadrias e colocar nova de vidro temperados. Pintura geral em todo
prédio.

Foto 26 – Fundo do prédio da prefeitura.
Remover as esquadrias e colocar nova de vidro temperados. Pintura geral em todo
prédio.

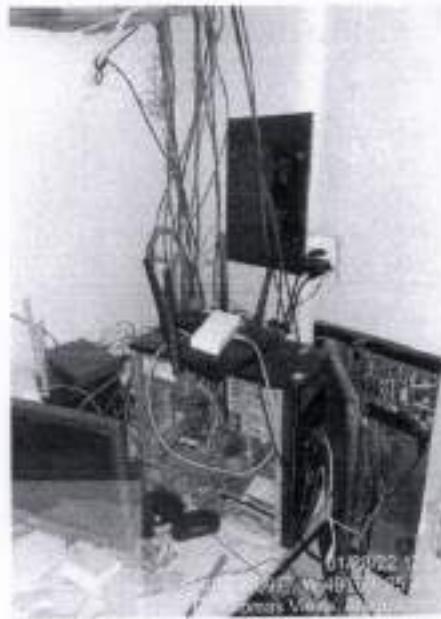

01/06/2012 12:31
S: 8° 48' 23.097" W: 49° 39' 26.524"
Rua Tomaz Vilela, Araguacema



01/06/2012 12:31
S: 8° 48' 23.097" W: 49° 39' 26.524"
Rua Tomaz Vilela, Araguacema

Foto 27 – Quadra distribuição de energia.
Toda instalação elétrica deverá ser refeita, com nova distribuição, equilibrando os
circuitos de toda instalação. Execução de uma nova rede para os ar condicionados e
computadores.

Foto 28 – Sala da central de informática.



PRÉDIO DA GARAGEM ANEXO DA PREFEITURA.



Foto 29 – Prédio da diretoria de limpeza urbana. Foto 30 – Prédio está com 2,0 m sobre a calçada.

Demolir as paredes que foram construídas sobre a calçada (passeio público) e refazer dentro do limite do terreno. Deverá ser retirado toda cobertura (forro, instalação elétrica). Refazer a cobertura com estrutura metálica e telha de fibrocimento ondulada de espessura d 6 mm.



Foto 31 – Sala da diretoria limpeza.

Foto 32 – Forro da sala.

Retirar as janelas que tem abertura para o vizinho e demolir o forro de madeira e refazer com PVC.



Foto 33 – Garagem e oficina



Foto 34 Garagem e oficina

Aumentar o tamanho da garagem e oficina. Levantar a cobertura até altura que possa entrar máquinas, caminhões e ônibus. Cobertura em estrutura metálica e telha de fibrocimento. As telhas existentes não dão para reaproveitar.



Foto 35 – Arquivo.



Foto 36 – Garagem e oficina.



Foto 37 – Alojamento.

Executar massa corrida e pintura no prédio de alojamento.



Foto 38 – Alojamento.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
GABINETE DO PREFEITO



Foto 39 – Floreira externa.



Foto 40 – Floreira interna.

Fazer impermeabilização das floreiras internas (pavimento térreo e superior) e planta novas plantas conforme ambientes.

Araguacema – TO, 03 de abril de 2022.

Assinado da forma digital por MARCIONE
NUNES COELHO 27014423168
DNI: 0308, n=ICP-Brasil, ou=C SOLUTI
Multiplo v1, ou=08072437000136,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A.I.,
ou=MARCIONE NUNES
COELHO 27014423168
Data: 2022-03-03 15:23:08 -0300

Marcione Nunes Coelho
Eng. Civil CREA-GO 5096/D
